

B工区地質記載シート

番号:B3-請負-計測工(地質)- 00089


シート番号	207	日 時	2009/9/2 5:05~8:10	位置・深度	G.L.-396.84~-400.20m No.3+6.25~No.3+3.25m	観察・撮影者	
-------	-----	-----	-----------------------	-------	--	--------	--

凡 例

- :花崗岩
- △ :変質部
- :割れ目
- :割れ目の傾斜
- - - :岩相境界
- 32 70 :計測角
- :削孔跡
- W :湧水
- 黒雲母密集部

総括監督員	主任監督員	監督員

請負人 清水・鹿島・前田特定建設工事共同企業体
現場代理人

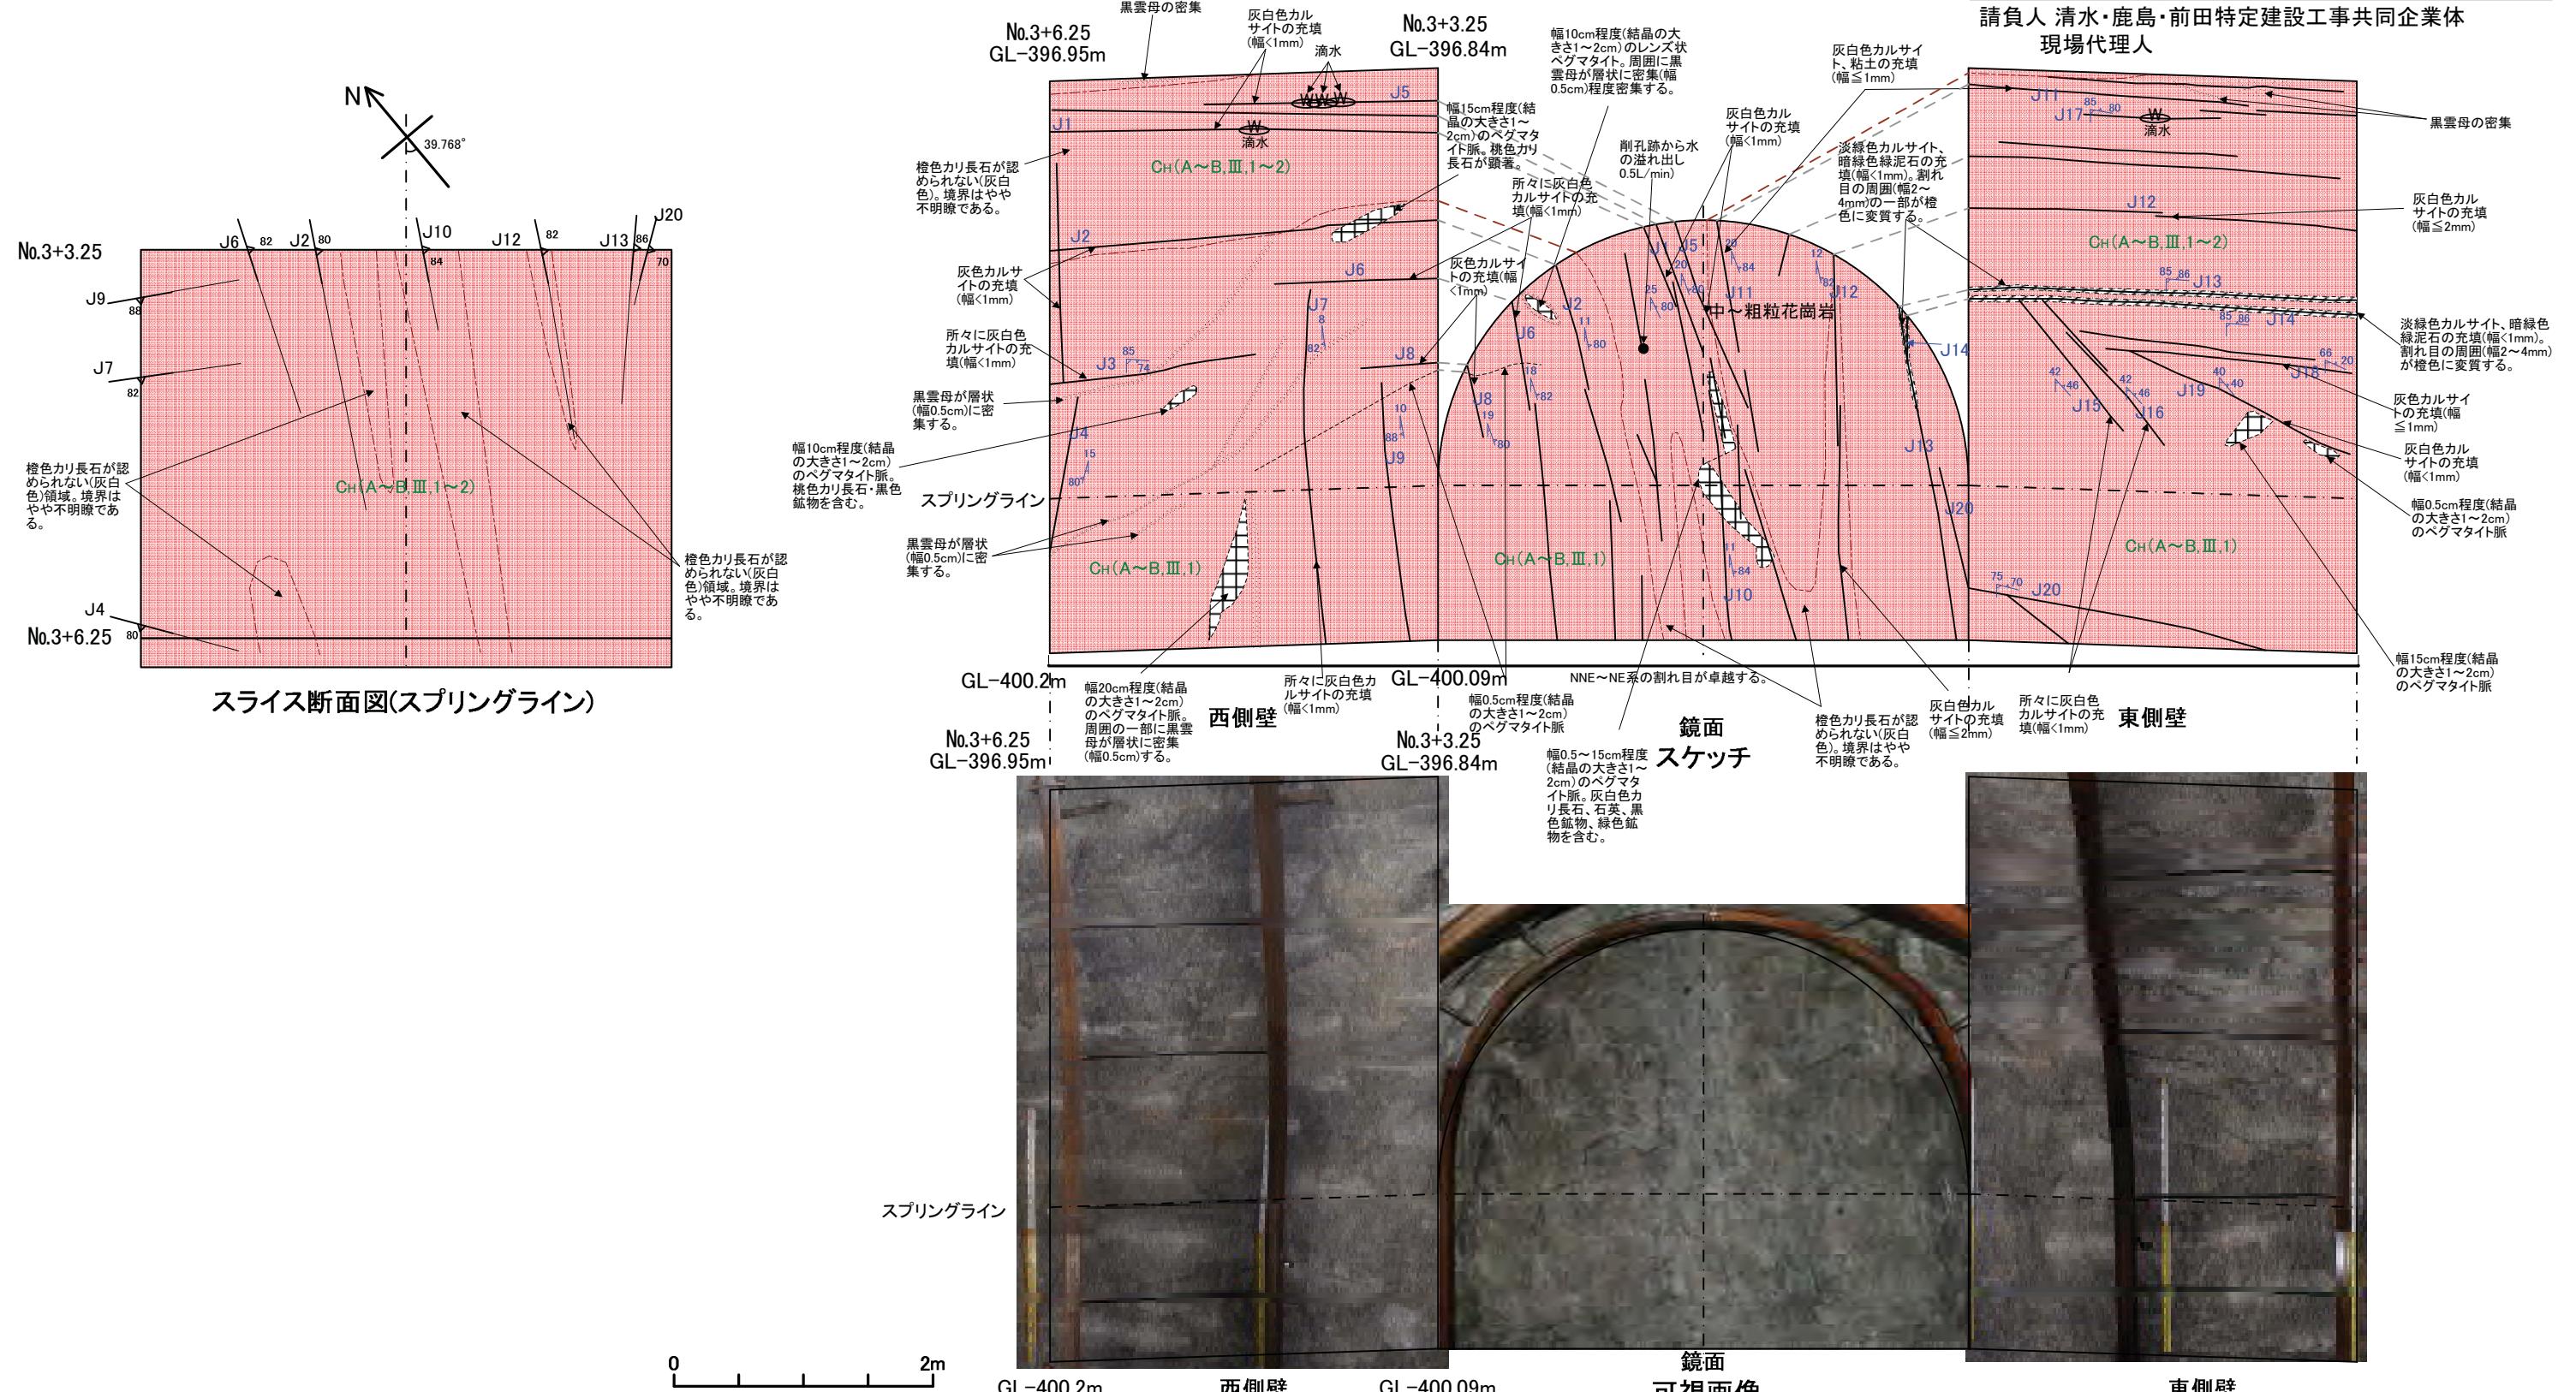

岩種	花崗岩	風化	α (新鮮)	RMR値	-396.84~-400.2m 73	特記事項	中～粗粒花崗岩(淡桃～灰白色)：等粒状の黒雲母花崗岩。鉱物の粒径は石英が5mm前後でしばしば複数個が1cm程の集合体をなす。長石類は3～20mmである。黒雲母は1～10mmである。有色鉱物の割合は7～10%程度である。西側壁、鏡面、東側壁にはベグマタイト脈(幅0.5～15cm)が認められる。ベグマタイト脈の周囲の所々に黒雲母が層状(幅0.5cm)に密集する。西側壁、東側壁天端部には黒雲母がベグマタイトとは伴わずに密集(幅0.5cm)する。
		変質	1(非変質) (一部2(弱変質)を含む)	岩石試料番号	なし		ハンマーでの打撃音は金属音～少し濁った音であり、岩盤は比較的堅硬である。変質は一部の割れ目周囲(J13, J14)に限られ、壁面全体では岩石は概ね新鮮である。岩盤等級は、すべての壁面で割れ目間隔が20～60cmのためCH級である。割れ目の狭在物は主にカルサイトであり、一部に緑泥石(J13, J14)、粘土(J11)を挟在する部分も認められる。
岩相	中～粗粒花崗岩(淡桃色、灰白色)	湧水	滲出 滴水	採水試料番号	なし		西側壁・鏡面・東側壁天端部には、桃色カリ長石が認められない領域があり、その領域内の割れ目自体は桃色変質を伴っていない(J1, J5, J10等)。湧水は、J1, J5, J17で滴水がみられる。その他の壁面でも滲出程度の湧水が存在する可能性はある。また、鏡面の削孔より水の溢れ出し(0.5L/min)が認められる。
		電研式岩級	-396.84~-400.2m C _H (A～B, III, 1～2)				・箇所は予備ステージ横坑であり、進行する方向はおよそN40°Eである。 ・壁面観察は鏡面から3.0m離れた場所より目視観察で実施した。

B工区地質記載シート

シート番号 208 日 時 2009/9/5
19:05~20:20 位置・深度 400Y-ST3
G.L.-396.79~-400.09m
N0.3+3.25~N0.3+1.65m 観察・撮影者


Diagram illustrating various geological features:

- 花崗岩 (Metamorphic Belt): A horizontal band with a grid pattern.
- 割れ目 (Foliation): A diagonal line with a wavy pattern.
- ベグマタイト脈 (Quartz Vein): A wavy line with a grid pattern.
- ゼノリス (Metamorphic Belt): A circular pattern with a grid pattern.



番号:B3-請負-計測工(地質)- 00090

總括監督員	主任監督員	監督員

請負人 清水・鹿島・前田特定建設工事共同企業体
現場代理人

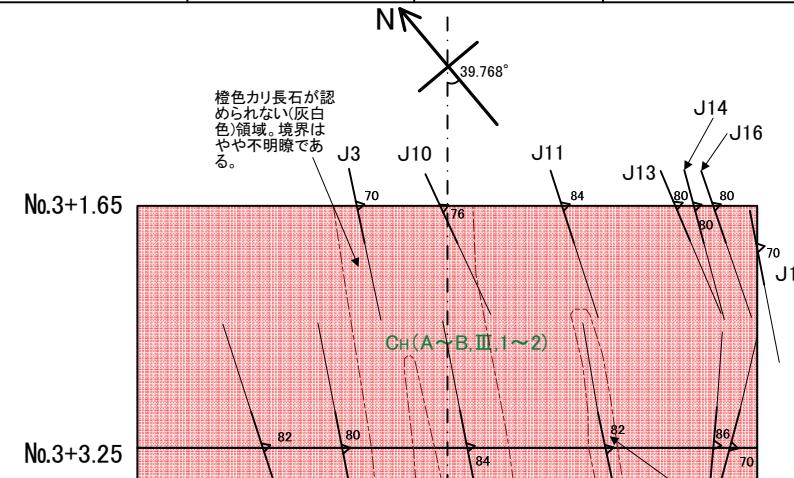

スライス断面図(スプリングライン)

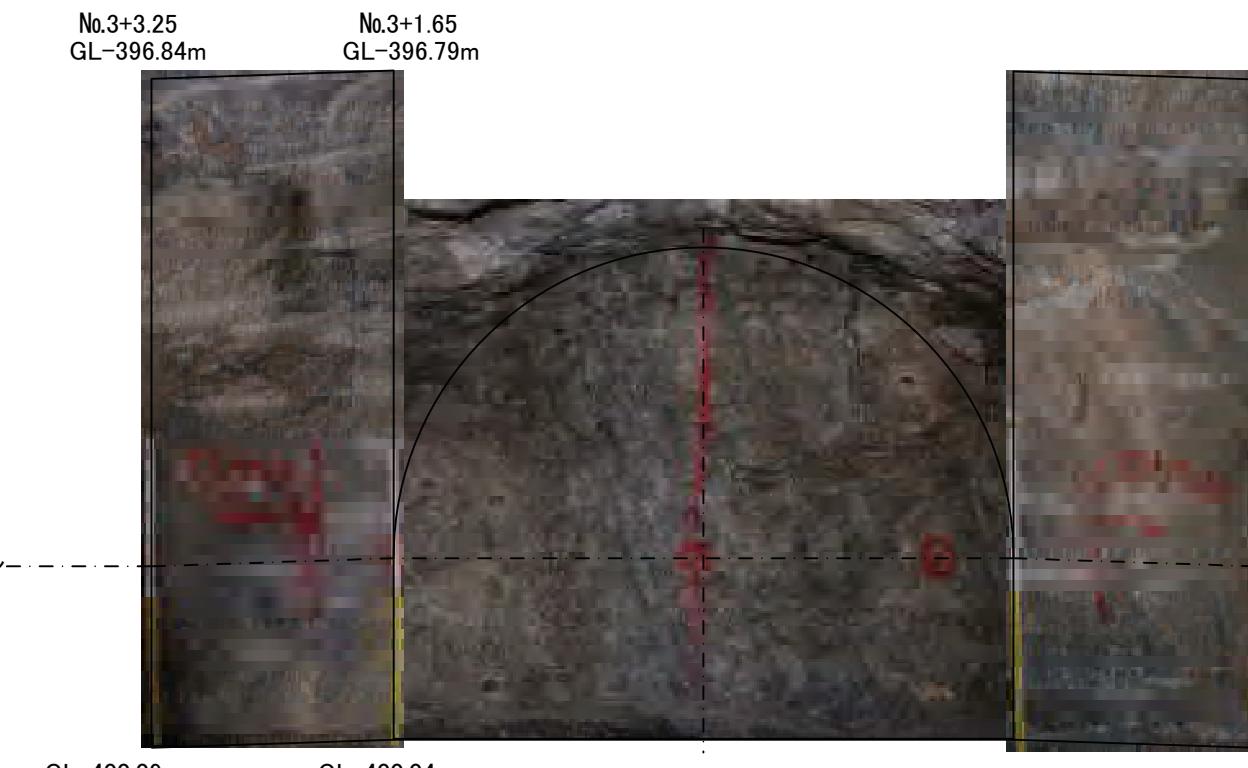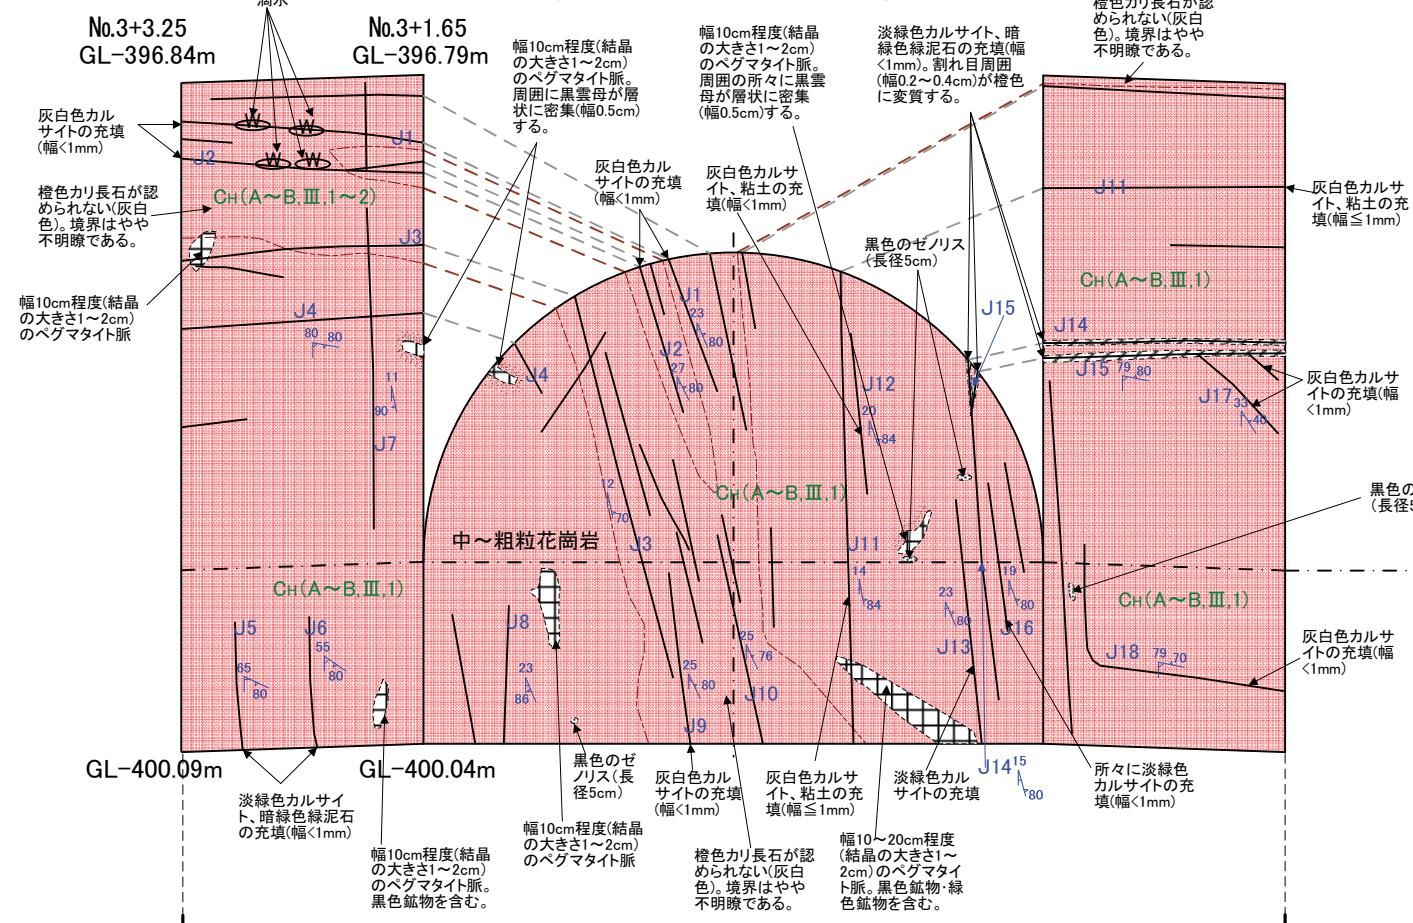

鏡面
可視画像

西側壁

鏡面
スケッチ

東側壁

岩種	花崗岩	風化	α (新鮮)	RMR値	-396.79～-400.09m 69	特記事項
		変質	1(非変質) (一部2(弱変質)を含む)	岩石試料番号	なし	
岩相	中～粗粒花崗岩(淡桃～灰白色)	湧水	滲出 滴水	採水試料番号	なし	
		電研式岩級	-396.79～-400.09m CH (A～B, III, 1～2)			


B工区地質記載シート

番号:B3-請負-計測工(地質)- 00091


シート番号	209	日 時	2009/9/8 3:50~5:20	位置・深度	400Y_ST4 G.L.-396.76~-400.04m No.3+1.65~-No.3+0.75m	観察・撮影者	
-------	-----	-----	-----------------------	-------	---	--------	--

總括監督員	主任監督員	監督員

請負人 清水・鹿島・前田特定建設工事共同企業体
現場代理人

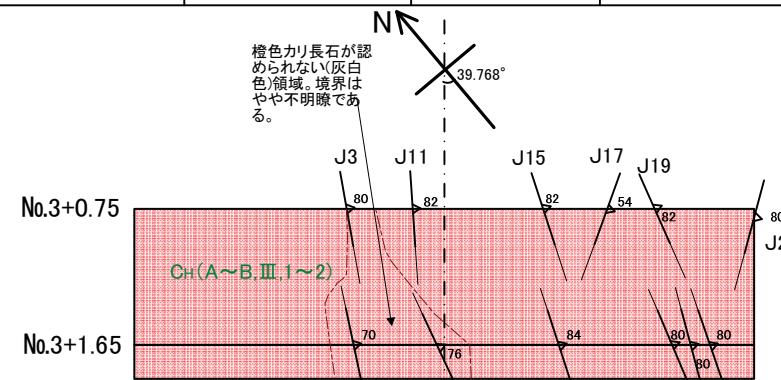


スライス断面図(スプリングライン)

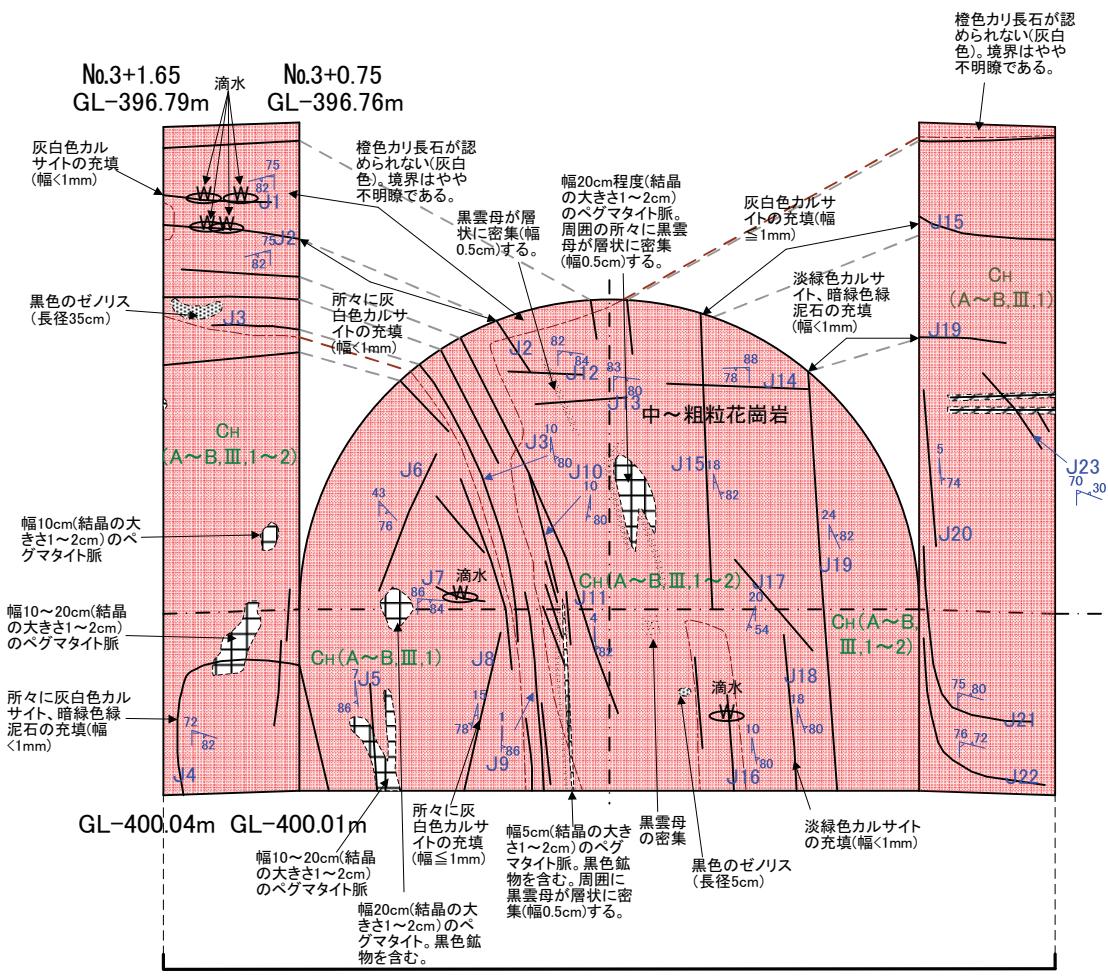

西側壁

鏡面
スケッチ

東側壁

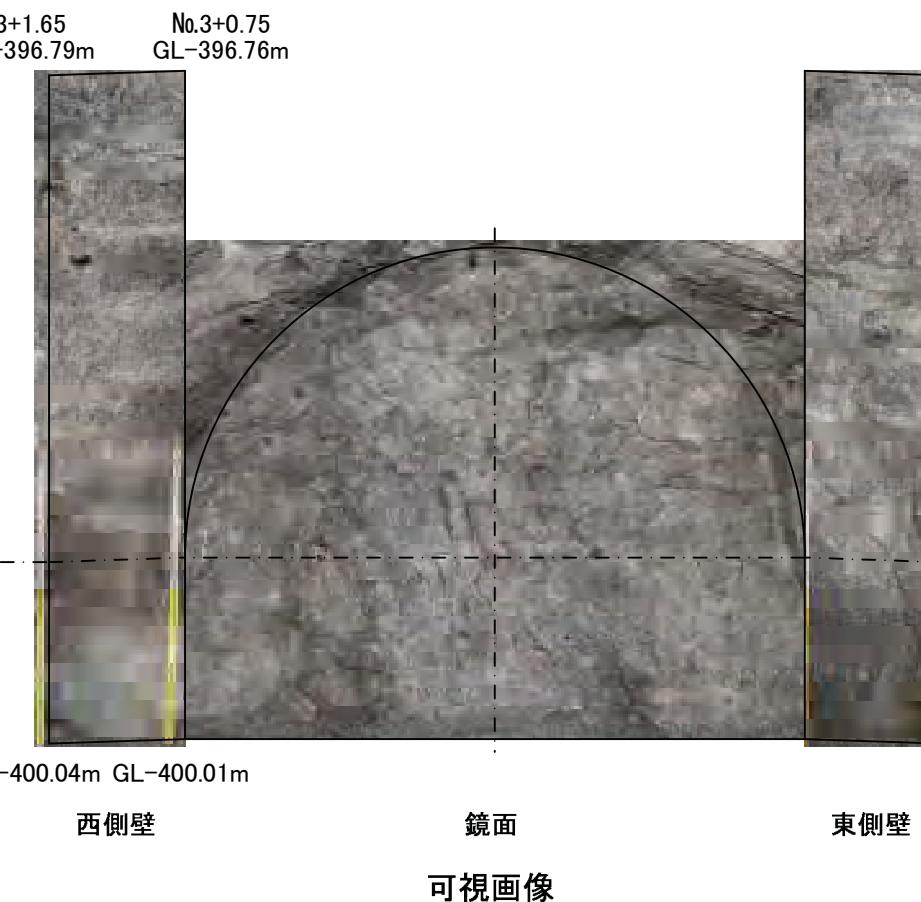

可視画像

岩種	花崗岩	風化	α (新鮮)	RMR値	-396.76～-400.04m 66	特記事項
		変質	1(非変質) (一部2(弱変質)を含む)	岩石試料番号	なし	
岩相	中～粗粒花崗岩(淡桃～灰白色)	湧水	滲出 滴水	採水試料番号	なし	
		電研式岩級	-396.76～-400.04m CH (A～B, III, 1～2)			
