
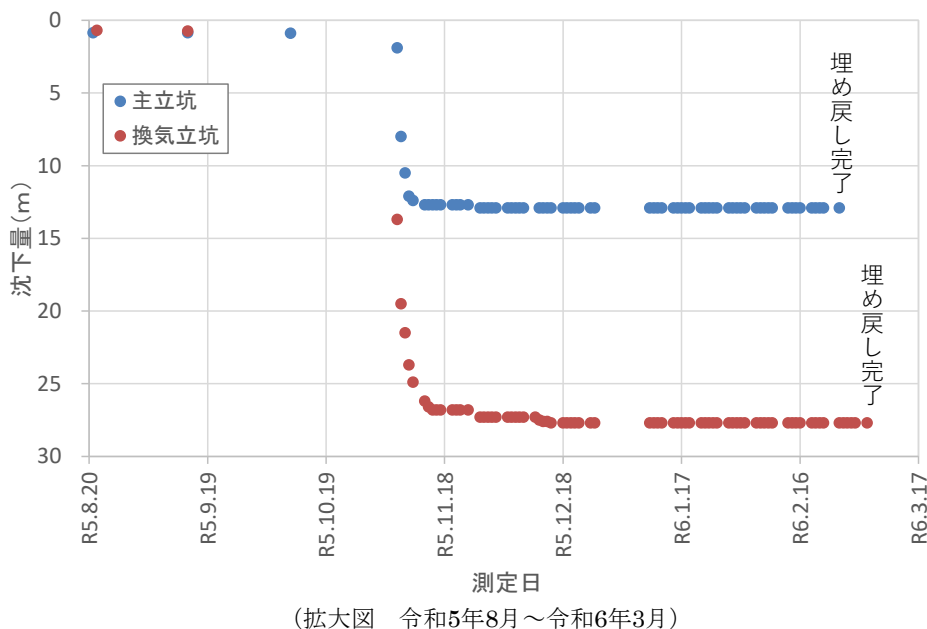


立坑埋め戻し面の沈下に係る測定 主立坑及び換気立坑の坑道埋め戻し完了後からの累積沈下量変化 (～令和6年3月8日)

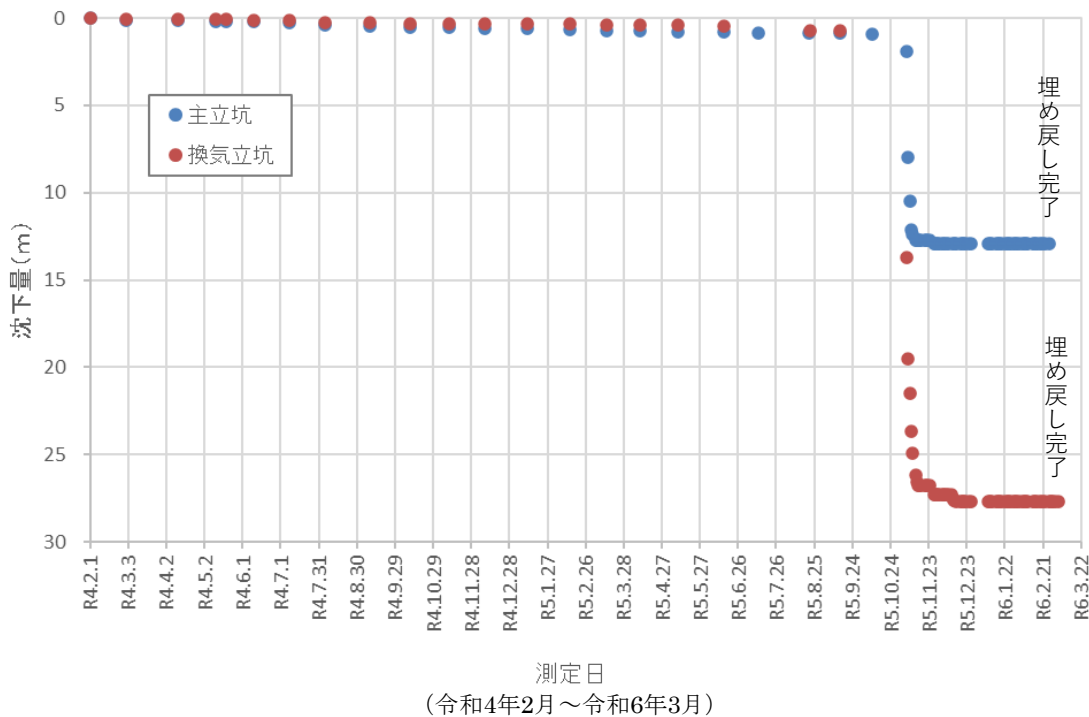

沈下量 : 令和4年2月1日から令和5年10月10日までは、令和4年1月の立坑埋め戻し完了以降の毎測定日の沈下量の合計、令和5年11月6日以降は地表面の基準点から立坑埋め戻し面までの深度を示す。

主立坑 : 立坑坑口への転落防止ネット設置のため、令和5年12月11日は測定中止
 年末年始休暇のため、令和5年12月27日～令和6年1月8日は測定休止
 埋め戻し作業に伴い、令和6年2月27日～令和6年3月1日は測定休止
 令和6年3月1日埋め戻し完了。

換気立坑 : 令和5年7月12日及び同年10月10日は、降雨等による周辺埋め戻し土(山砂)の流入により測定点が覆われたため測定中止
 年末年始休暇のため、令和5年12月27日～令和6年1月8日は測定休止
 埋め戻し作業に伴い、令和6年3月5日～令和6年3月7日は測定休止
 令和6年3月8日埋め戻し完了。
