平成22年5月6日
独立行政法人日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅ　性能試験（炉心確認試験）
実　施　状　況

13：00現在

概　要
制御棒が核分裂反応を抑制する効果を測定する制御棒価値確認試験を、計画通り安全に実施している。

		備　考
プラント状態	異常なし。 1次主冷却系流量　約49％　1次主冷却系温度　約200℃ 2次主冷却系流量　約7％（ポニーモータ運転）　2次主冷却系温度　約200℃	
性能試験実施状況	【昨日（5/5）の実績】 09：55　1次主循環ポンプ主モータ起動　原子炉容器カバーガス昇圧開始 14：14　原子炉容器カバーガス昇圧完了 【本日の実施状況】 制御棒価値確認実施中 09：47　原子炉モードスイッチ　「停止」→「起動」切替 10：36　制御棒引抜開始（性能試験再開） 23時頃　本日の試験終了（予定） 【明日の予定】 制御棒価値確認を実施予定。 圧力損失変化評価（1次主冷却系に冷却材を循環させるために必要な圧力差の経時変化評価）を実施予定。	
その他	5月8日、原子炉が臨界に達する予定。	
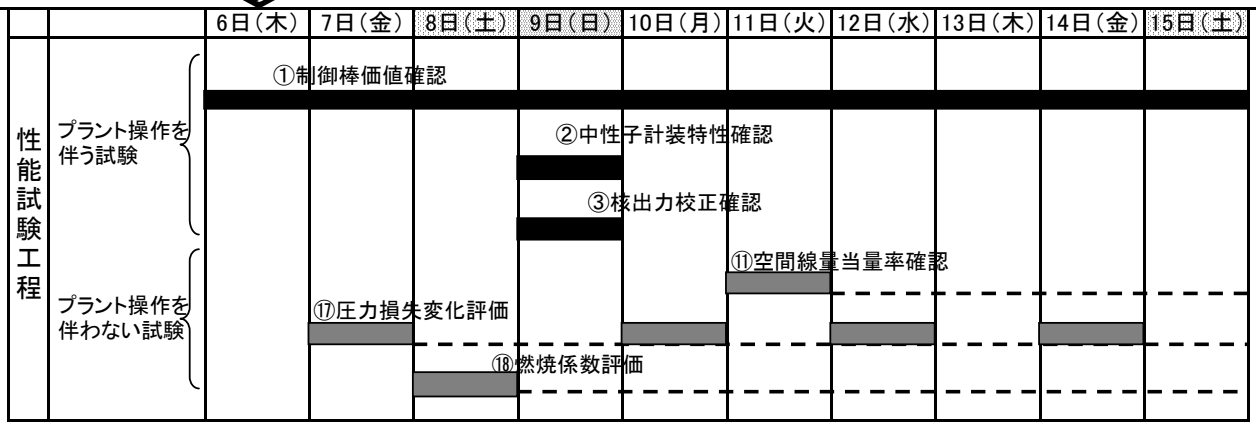
炉心確認試験工程
