TVF竜巻防護対策工事

【概要】 工事完了

ガラス固化技術開発施設（TVF）の竜巻防護対策として，当該建家の開口部に防護板，防護扉及び防護フードを設置し閉止する。

作業期間は，令和4年10月3日から令和6年3月29日。

（令和6年3月29日に設置工事を完了。令和6年5月30日に設置後の検査を完了。）

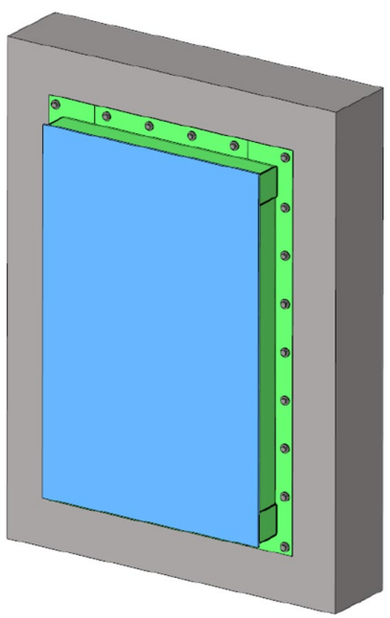

防護板
（既設窓部へ設置）

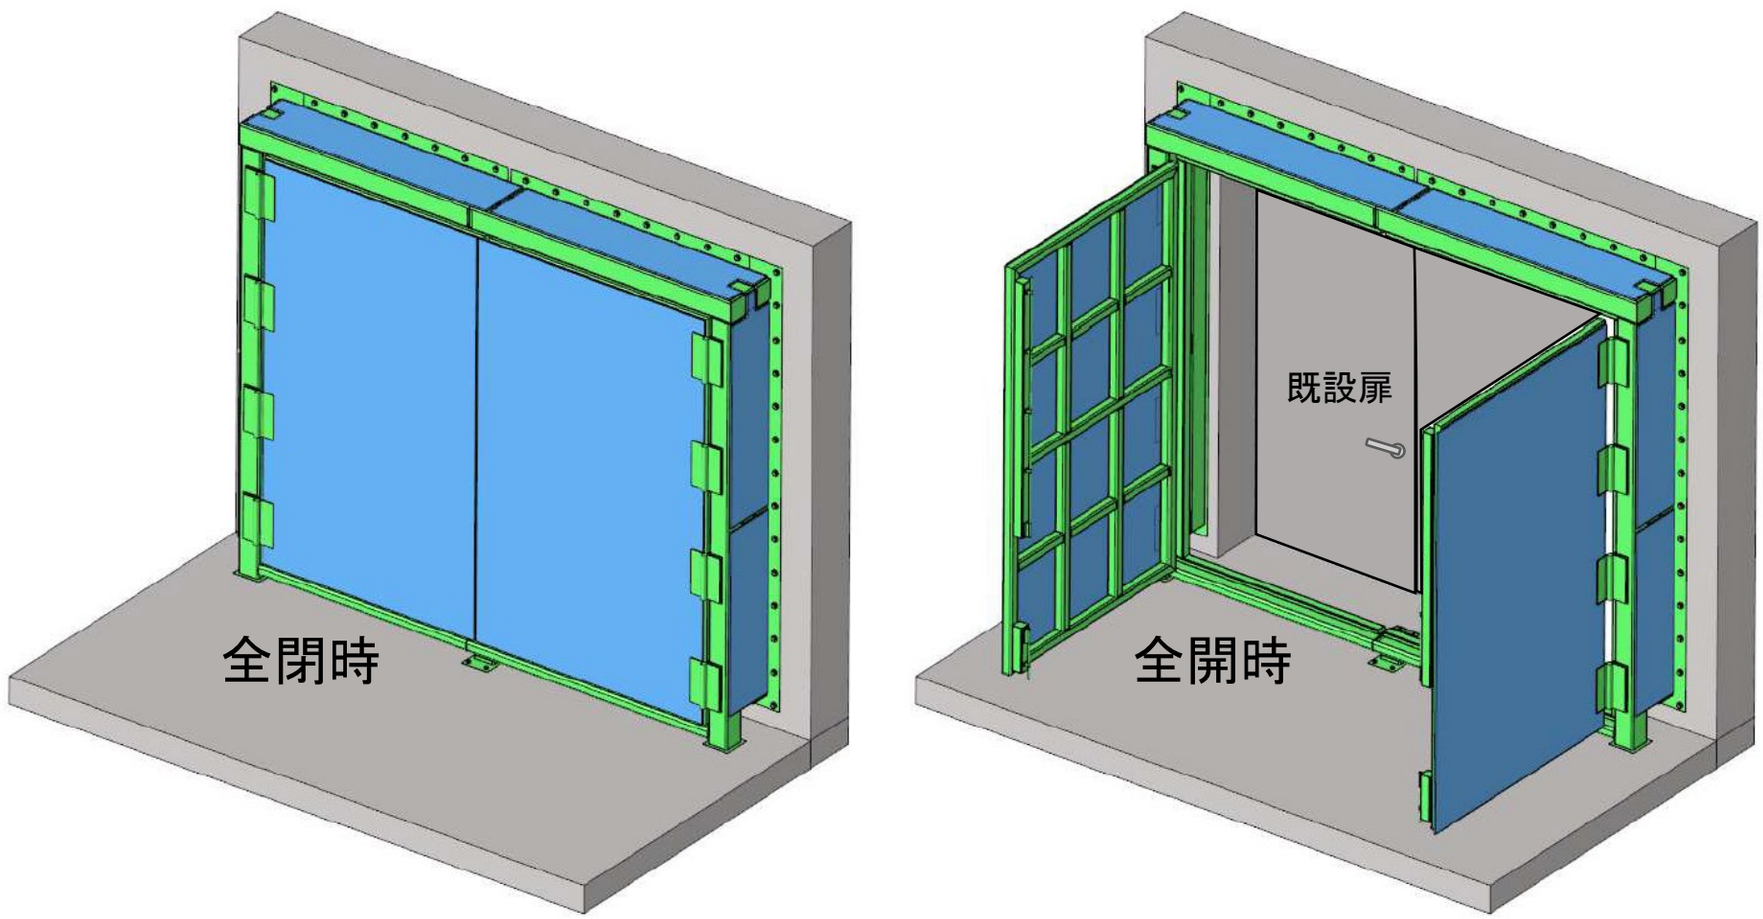

防護扉（既設扉部へ設置）

開口部に対する閉止措置のイメージ
